관리번호	육아종합지원센터 개소
2-2	

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2022년~2024년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	15,283백만원	완료시기	임기내
추진부서	가족행복과 보육담당 (장초록 ☎5642)	협조부서	市 출산보육과 (이하영 ☎888-1574)

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

○ 지역사회 내 One-Stop 육아지원을 위한 거점기관으로서 어린이집 지원 및 관리, 가정양육 보호자에 대한 맞춤형 육아지원서비스 제공

□ 사업개요

○ 위　　치 : 당리동 317-52번지

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2024년(2024. 3월 준공, 7월 개관)

○ 사 업 비 : 15,283백만원(국비 1,000, 시비 2,400, 구비 8,583, 특별교부세 800, 특별교부금 2,500)

○ 사업내용 : 당리동 복합센터 내 5 ~ 7층, 연면적 918.46㎡

▷ 당리동 복합센터 : 건축면적 344.91㎡, 연면적 2,690.02㎡(지하 2층,지상 8층)

○ 주요시설

구 분	층 별	주 요 시 설	면적(㎡)
육아종합지원센터	7층	실내놀이시설 등	261.49
	6층	장난감대여실, 프로그램실, 수유실 등	329.65
	5층	시간제보육실, 프로그램실, 놀이치료실, 상담실, 사무실	327.32

○ 운영내용 : 부산보건대학교 위탁(2024.04.18. ~ 2029.04.17.)

- 어린이집 지원 사업(보육교직원 교육, 대체조리사 파견, 물품 대여 서비스 등)
- 가정양육 지원 사업(부모자녀 참여 프로그램, 부모상담, 영유아놀이실 체험 등)
- 정보제공 및 지역특성화 사업(홈페이지 운영, 지역사회 연계, 아동친화도시 사하, 미(美)운우리손주 등) 등 추진

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	50%	90%	100%	-	-	-
육아종합지원센터 개소	공사착공	공사추진	개소 (7월)	-	-	-

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	15,283	4,623	10,660	9,800	300	560	-	-	-
국 비	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-
시 비	2,400	1,600	800	500	300	-	-	-	-
구 비	8,583	523	8,060	7,500	-	560	-	-	-
기 타	3,300	1,500	1,800	1,800	-	-	-	-	-

【추진실적】

○ 2020. 02. : 당리동 복합센터 건립 기본계획 수립
(당리동 복합센터 내 육아종합지원센터 수립)
○ 2020. 09. : 사업대상 부지 및 건물 매입 완료
○ 2020. 11. ~ 2021. 03. : 매입 건물 철거 공사 및 설계 공모
○ 2021. 03. ~ 2022. 02. : 기본 및 실시설계용역
○ 2022. 04. : 공사 착공
○ 2023. 05. : 관련 조례 제정 ▷ 사하구 영유아 보육 조례
○ 2023. 08. : 사하구 육아종합지원센터 위탁운영기관 선정 ▷ 부산보건대학교
○ 2023. 10. : 인테리어 공사 설계
○ 2024. 03. : 공사 준공
○ 2024. 03. ~ 06. : 인테리어 공사시행 및 개관 준비
○ 2024. 07. 05. : 개관
○ 2024. 07. ~ 08. : 시범운영
○ 2024. 09. : 정식운영

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기 타
-	-	-	1회	-

【기대효과】

○ 지역 내 육아지원을 위한 거점기관으로서 종합적이고 체계적인 보육 및 육아 서비스 제공

【관련사진】
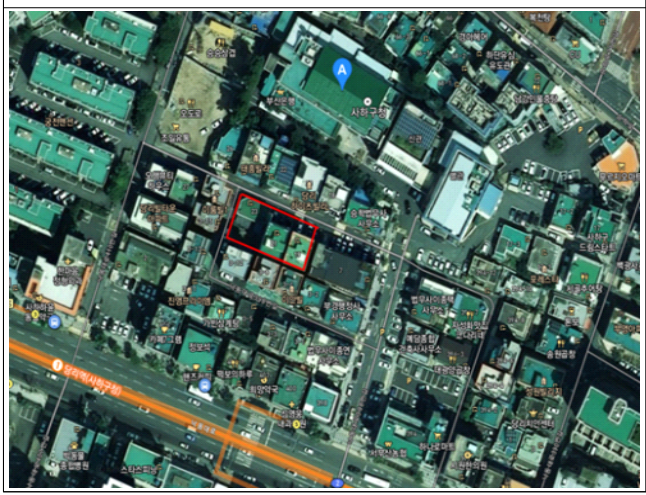
위 치 도	현 장 사 진
